




Straßen.NRW

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Ausbau der B51 und Neubau der B481 Umgehungsstraße Münster

B51/B481 Umgehungsstraße Münster

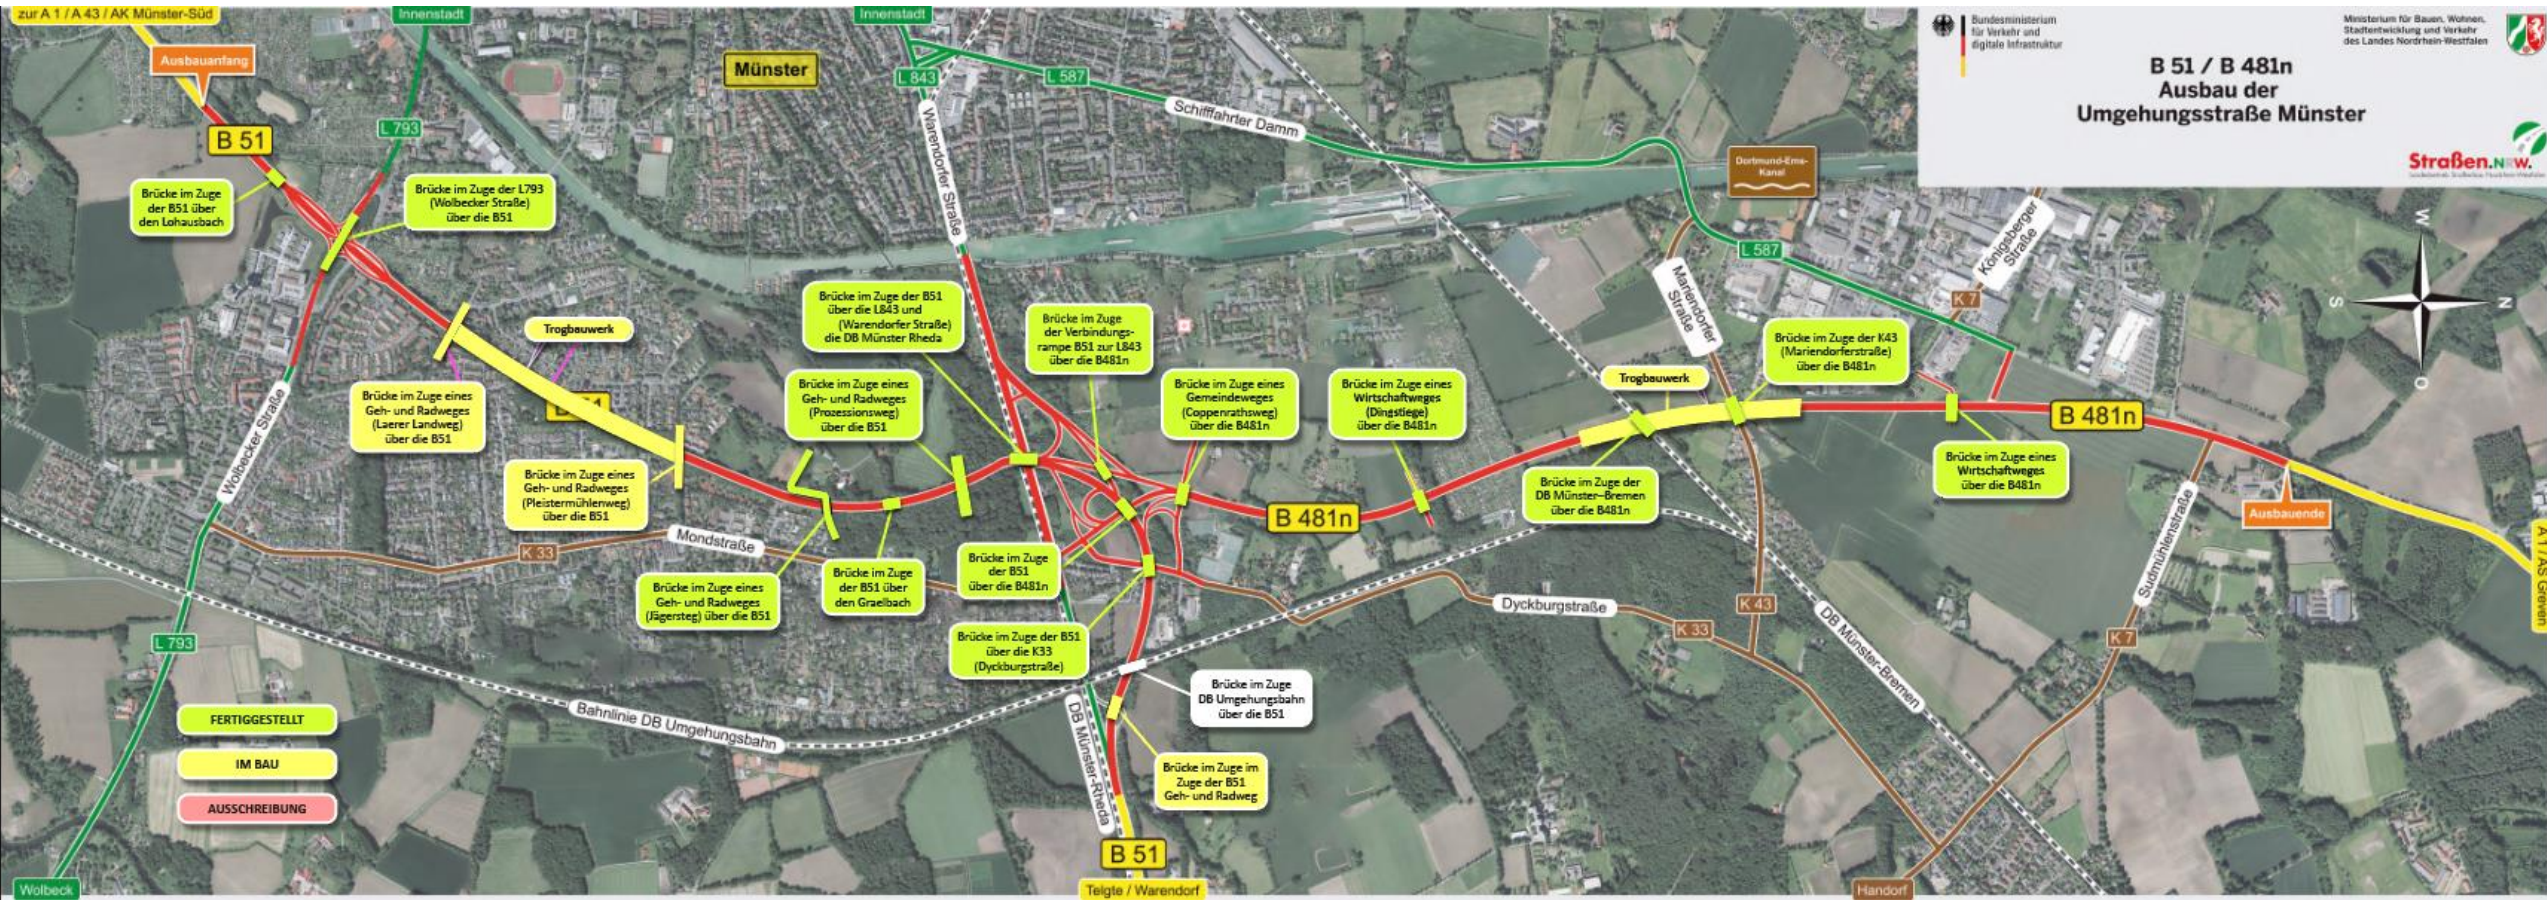

Planfeststellungsbeschluss 2014

1. Spatenstich 2015



Fertigstellung Frühjahr 2028



Das Bauen unter Aufrechterhalten des Verkehrs mitten im Stadtgebiet erfordert eine hohe Sensibilität gegenüber den betroffenen Anwohnern und Verkehrsteilnehmern

Bürgersprechstunden

Straßen.NRW-Projektseite
[B51-Ausbau und B481-Neubau in Münster - Straßen.NRW](#)



April 2026 – Einbau letzte
Asphaltschicht Mai 2026

Trog Mauritz – Radwegbrücken komplett fertig Mai 2026




Mai – Dezember 2026
Aufbau der Lärmschutzwände



Zahlen/Daten/Fakten

Baubeginn	2021
Bauzeit	
(incl. Bohrpfehlwand)	5 Jahre
Kosten	
(incl. Bohrpfehlwand)	60 Mio. €
Bodenaushub	115.000m ³
Betonmenge	34.500m ³
Betonstahl	4.600t
Entspannungsbohrungen	4.000m

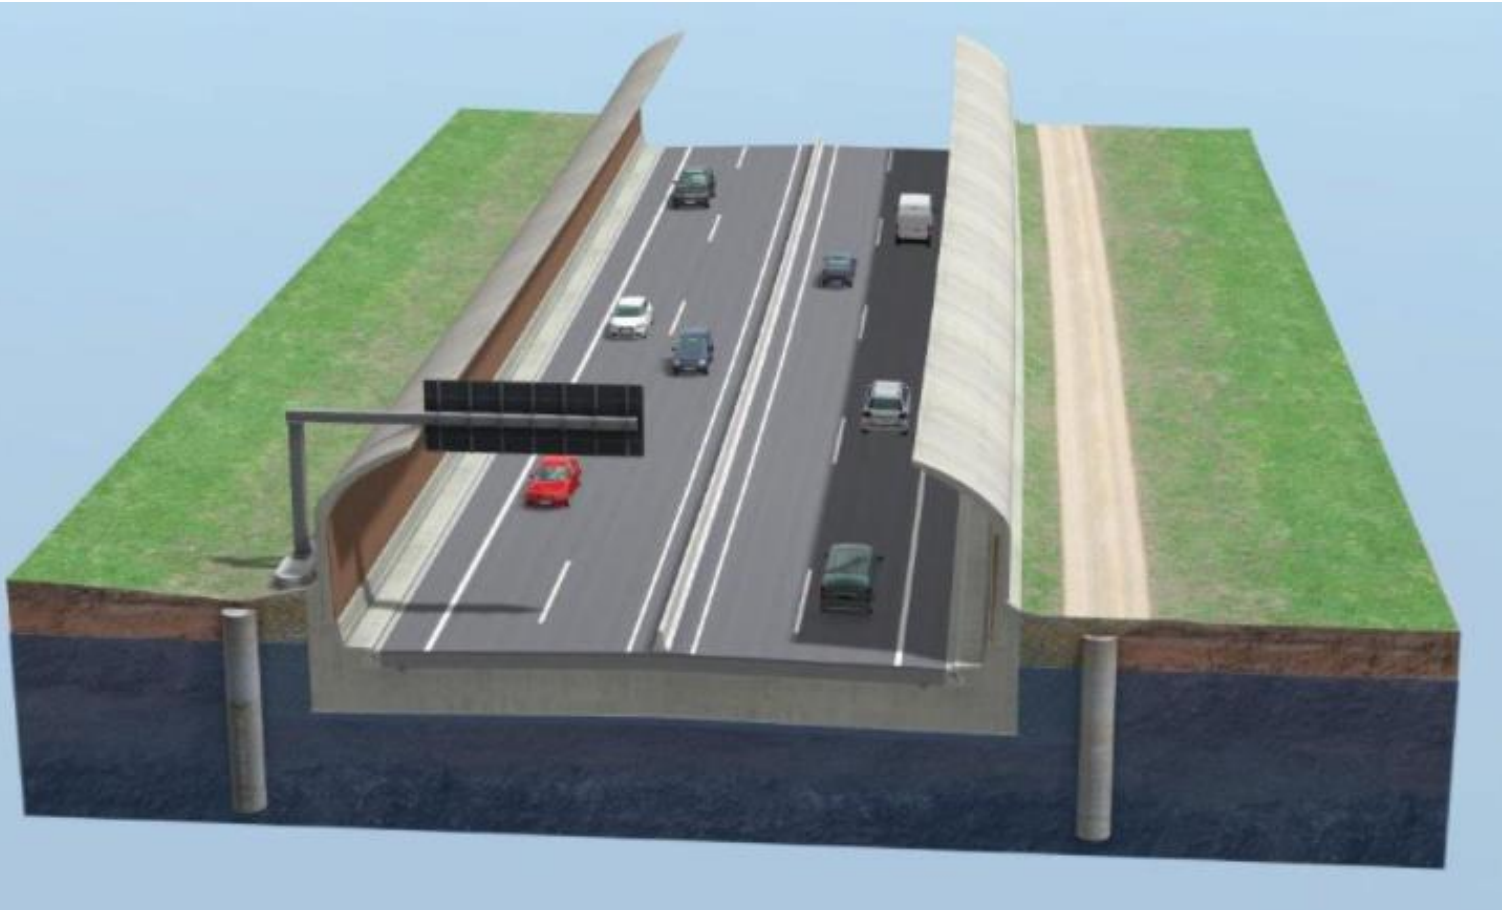



September 2025:
Fertigstellung
Warendorfer Straße

Neubau der B481 Trog Mariendorf



Länge: 610 m

Lichte Weite: 14,50 m

Fertigstellung Bahnbrücke 2021

Fertigstellung RRB Mariendorf 2023

Fertigstellung Trog Mariendorf Ende 2027

Neubau der B481 – nördliche Zuwegung Trog Mariendorf




Straßen.NRW
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen





Neubau bis Sudmühlenstraße
und Anschluss an heutige B 481n bis Ausbau
Hessenweg geplant für 2026

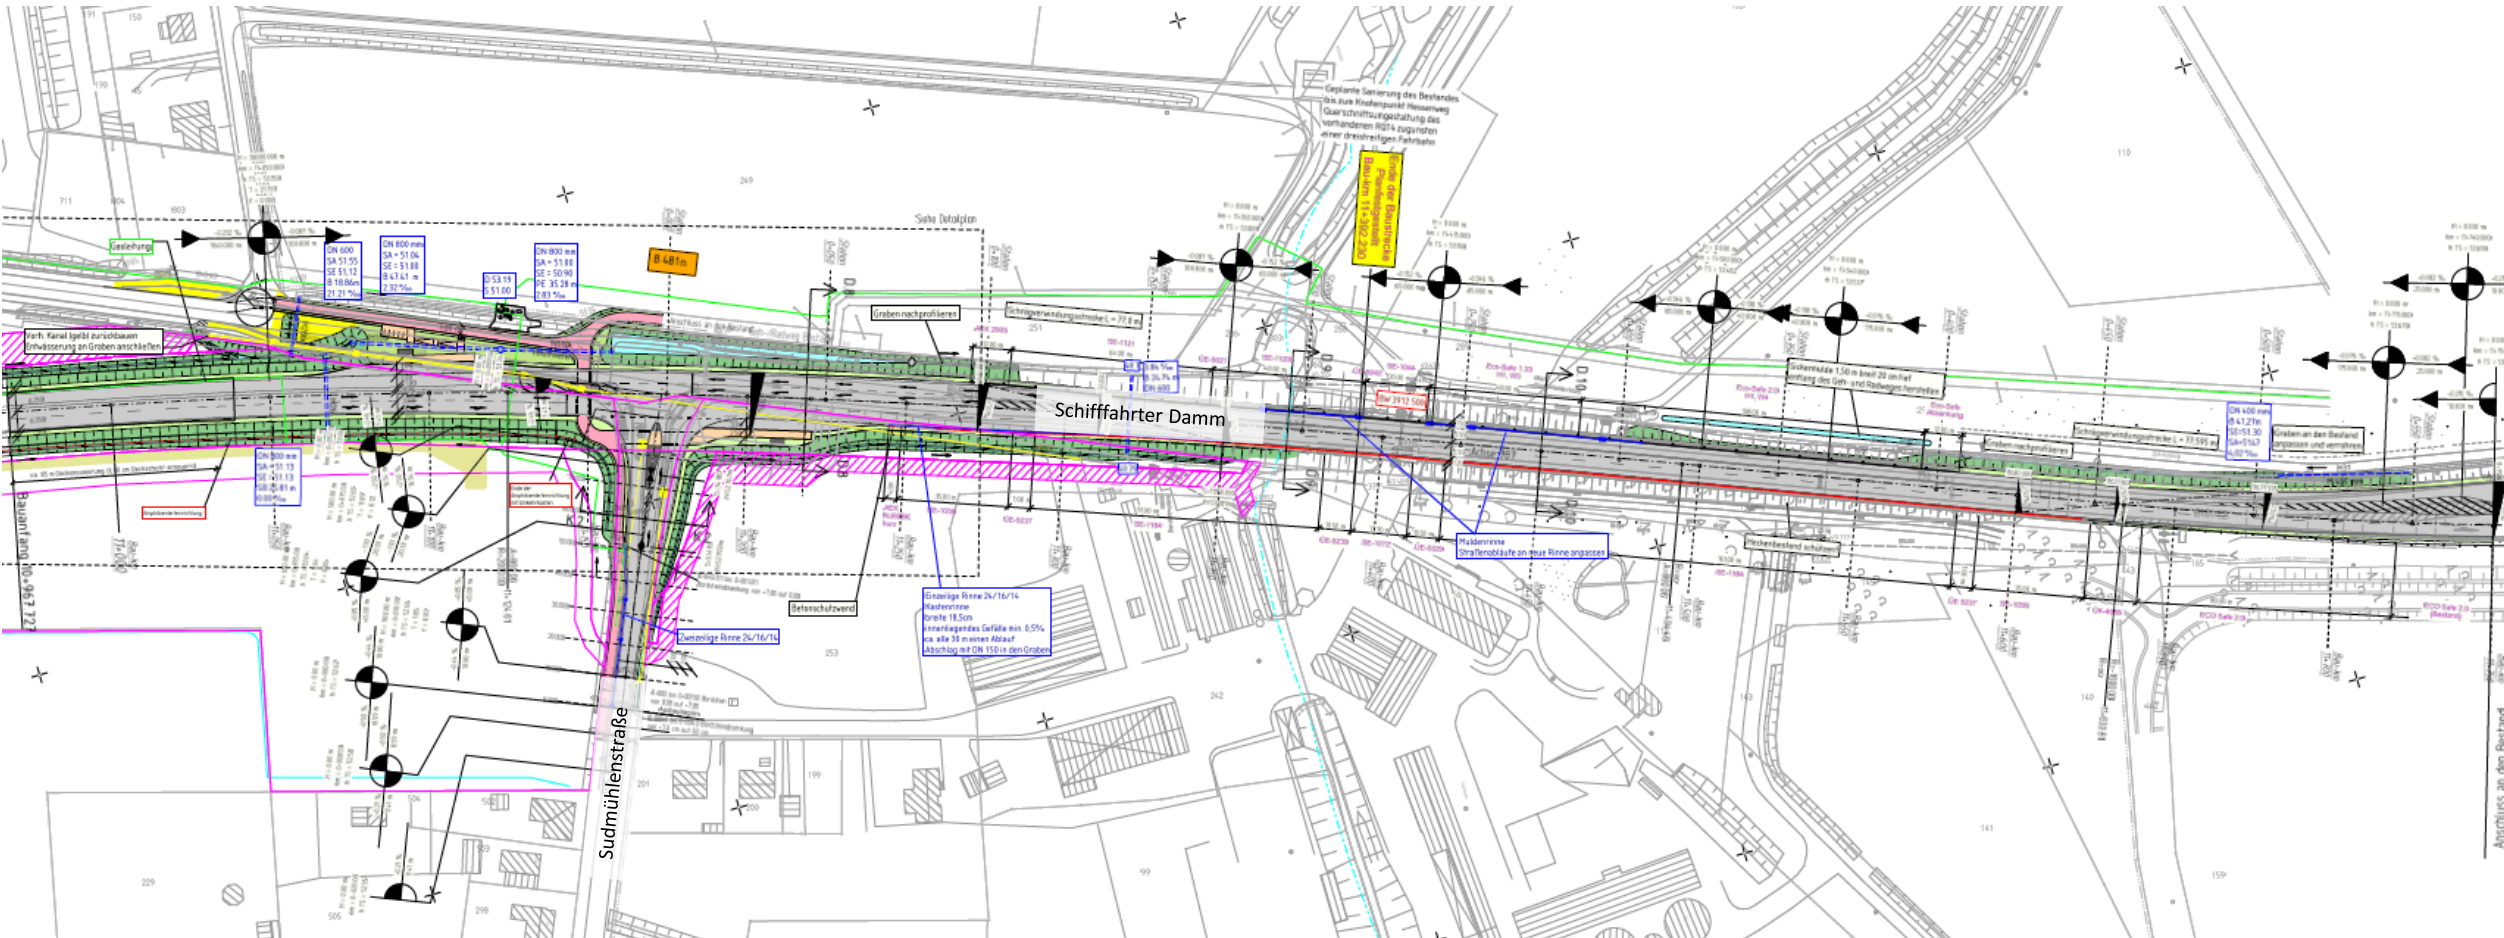

Neubau bis Sudmühlenstraße
und Anschluss an heutige B 481 bis Ausbau Hessenweg


Hauptarbeiten:

- Grundlegende Fahrbahnerneuerung – kompletter Oberbau (Ausbau 70cm tief)
- Neubau 300 Meter Betonschutzwand auf Fundamenten
- Brückeninstandsetzungsarbeiten
- Technisch anspruchsvolle Asphaltherstellung - Schrägverwindungen – Einbau nur in voller Breite möglich



Herausforderung Bauablaufkonzept:

Leitungsverlegungen erforderlich- Arbeiten Sudmühlenstraße- Arbeiten Schiff. Damm


→ Unterschiedliche Arbeitsschritte optimal verzahnen

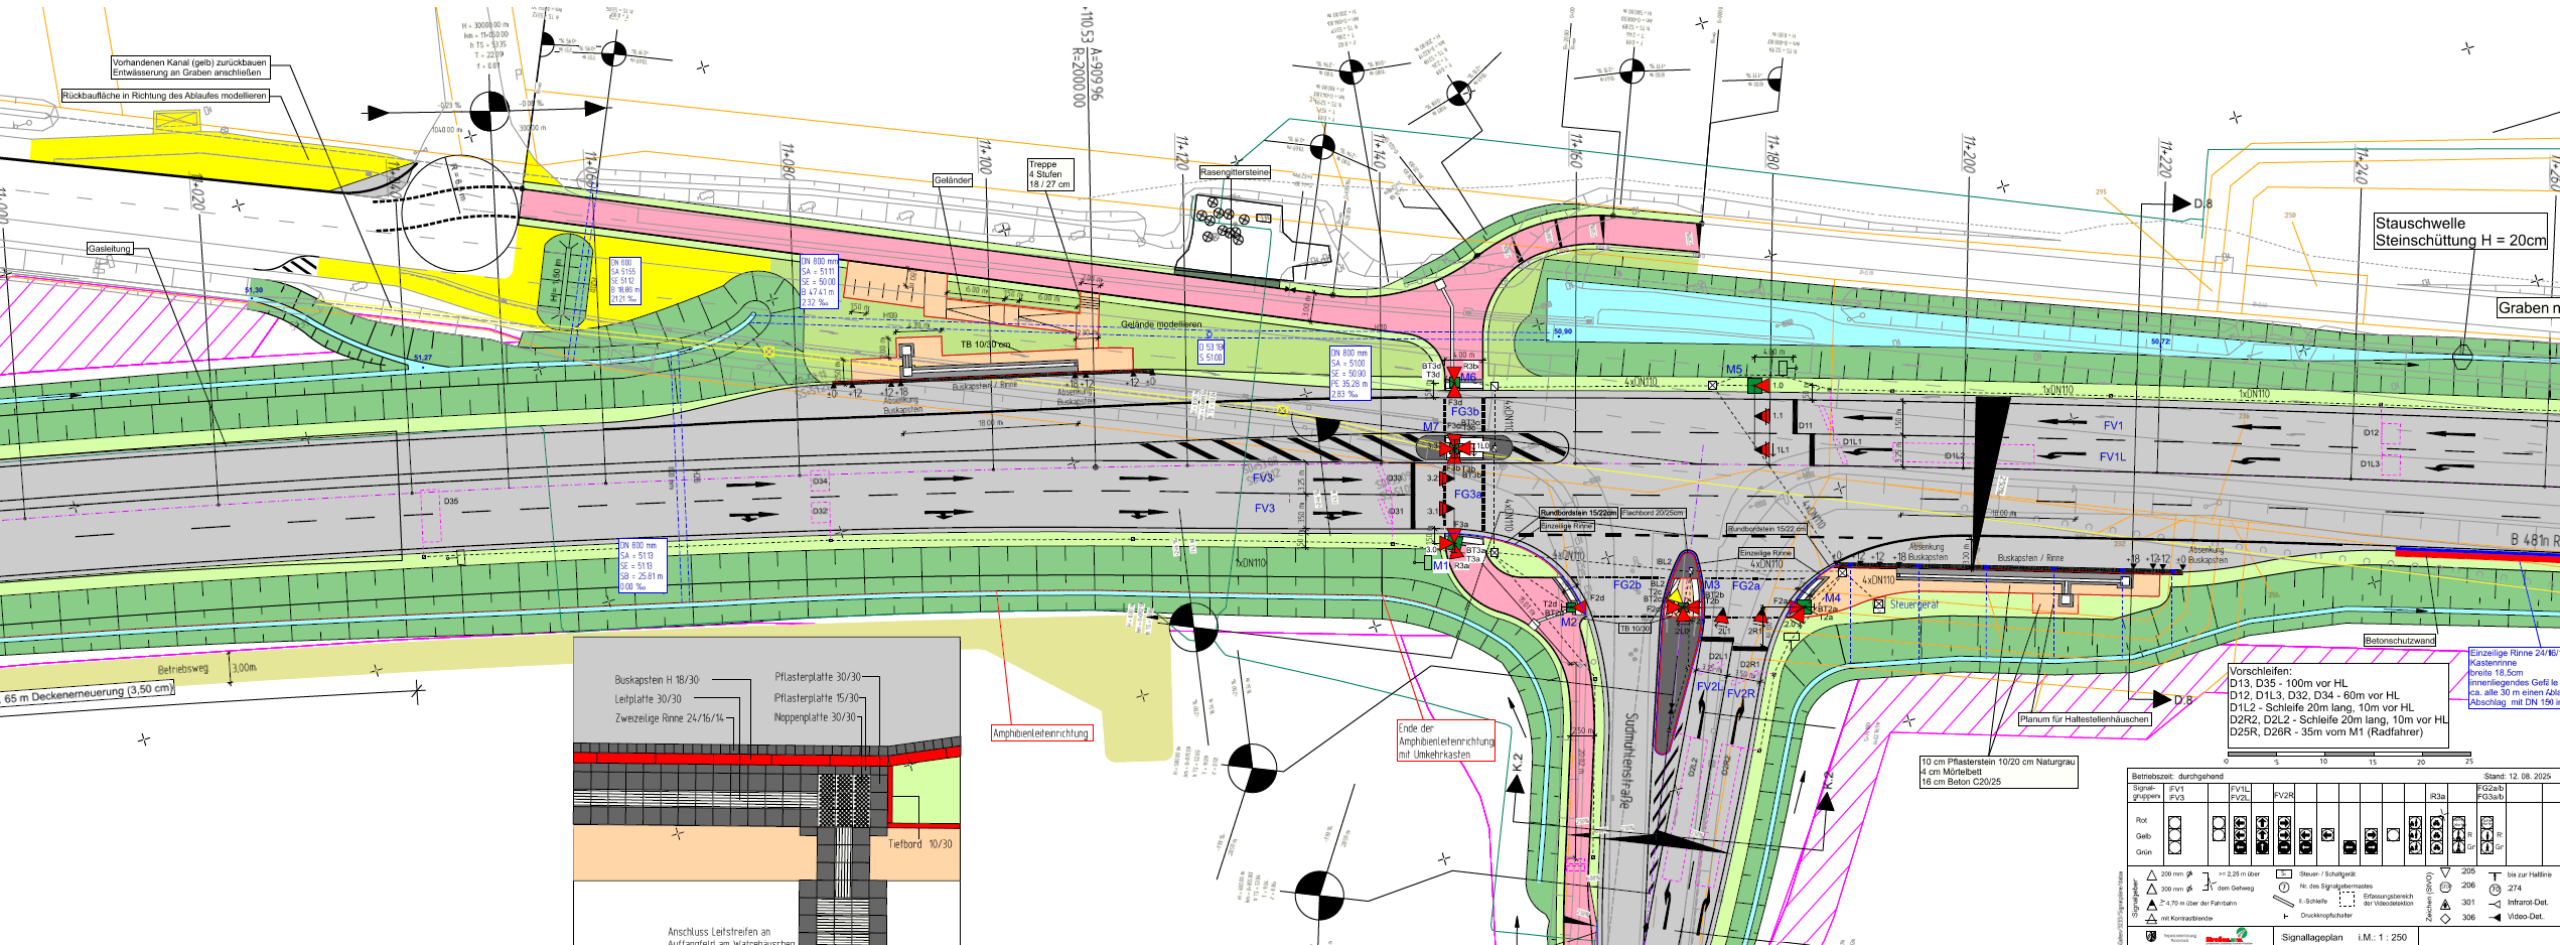

Neubau bis Sudmühlenstraße
und Anschluss an heutige B 481 bis Ausbau Hessenweg

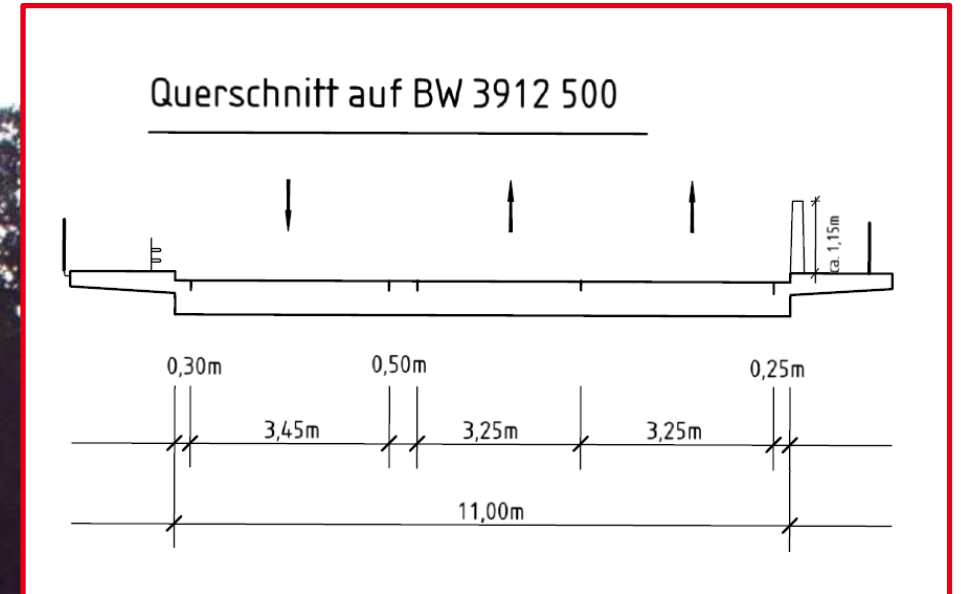
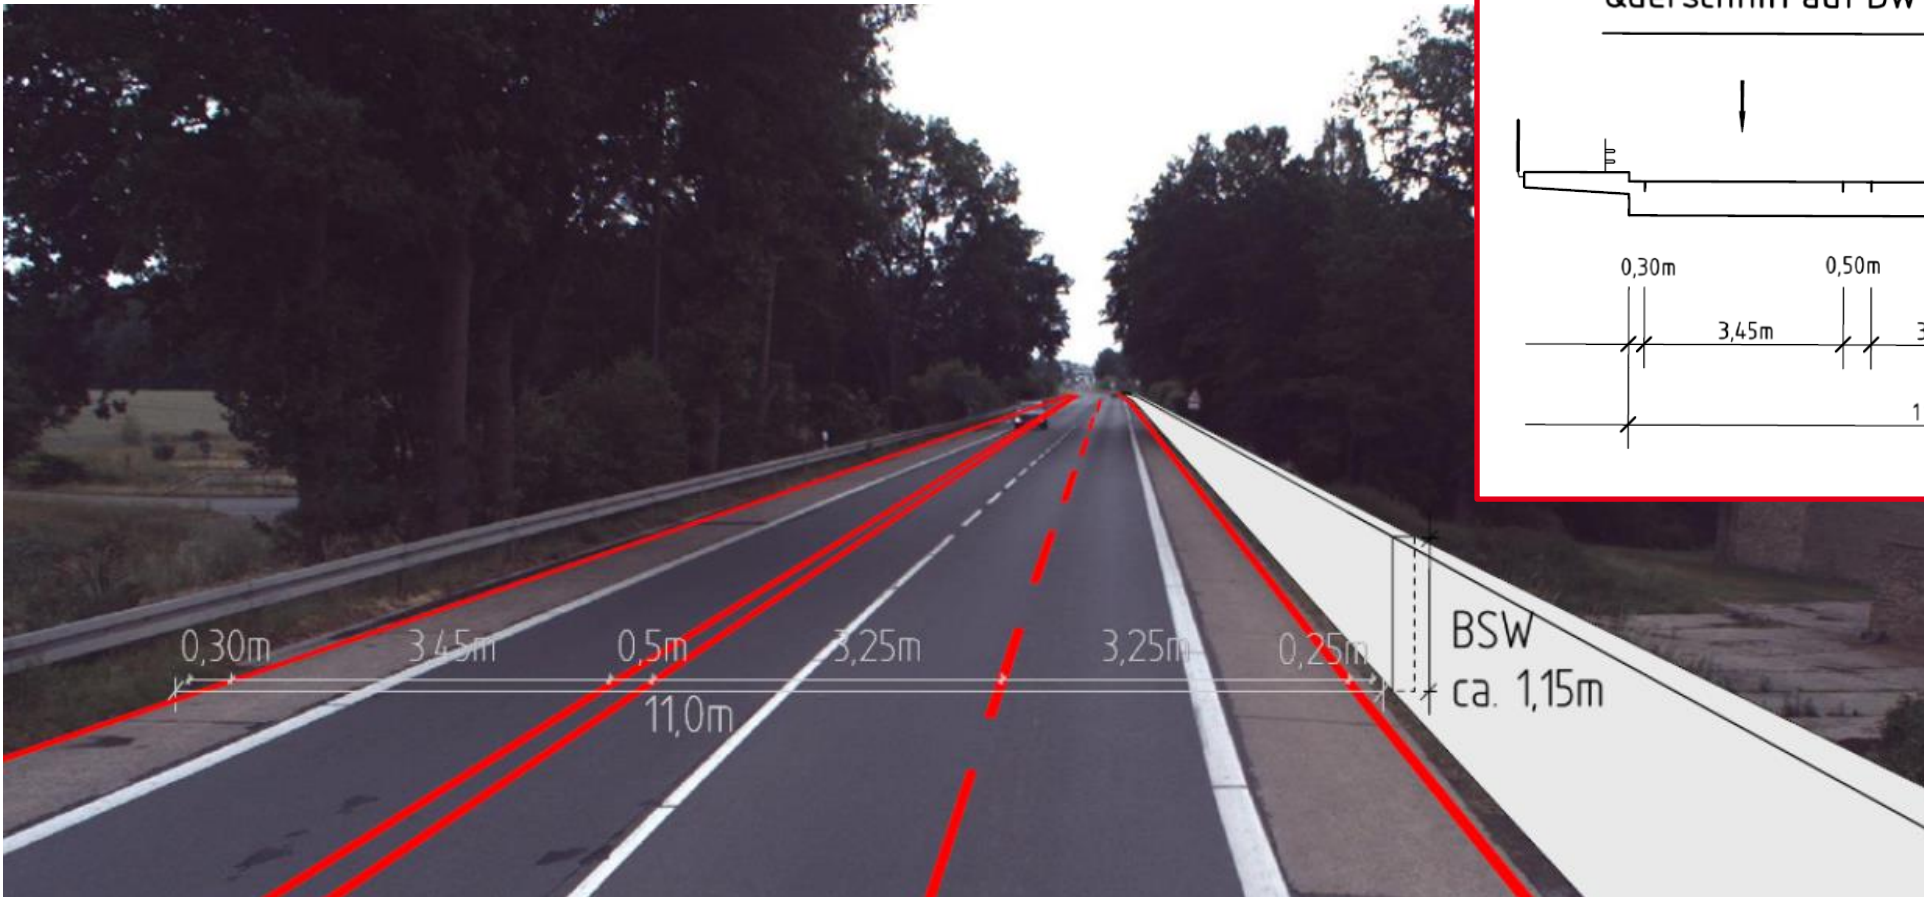


- 2024 -2025** Vorstellung erster Ideen – in Abstimmung des Gesamtkonzeptes B51/B481 wurde festgelegt, den Knotenpunkt Sudmühlenstraße kompakt nach erkennbaren Baufortschritt Trog Mariendorf einzuplanen
- 29.10.2025** Auftaktveranstaltung Baustellen MS (Stadt, Polizei, Feuerwehr, ÖPNV)
- 22.01.2026** Abstimmung /Termin Feinheiten zur Verkehrsführung → Festlegung Ausweichbuchten

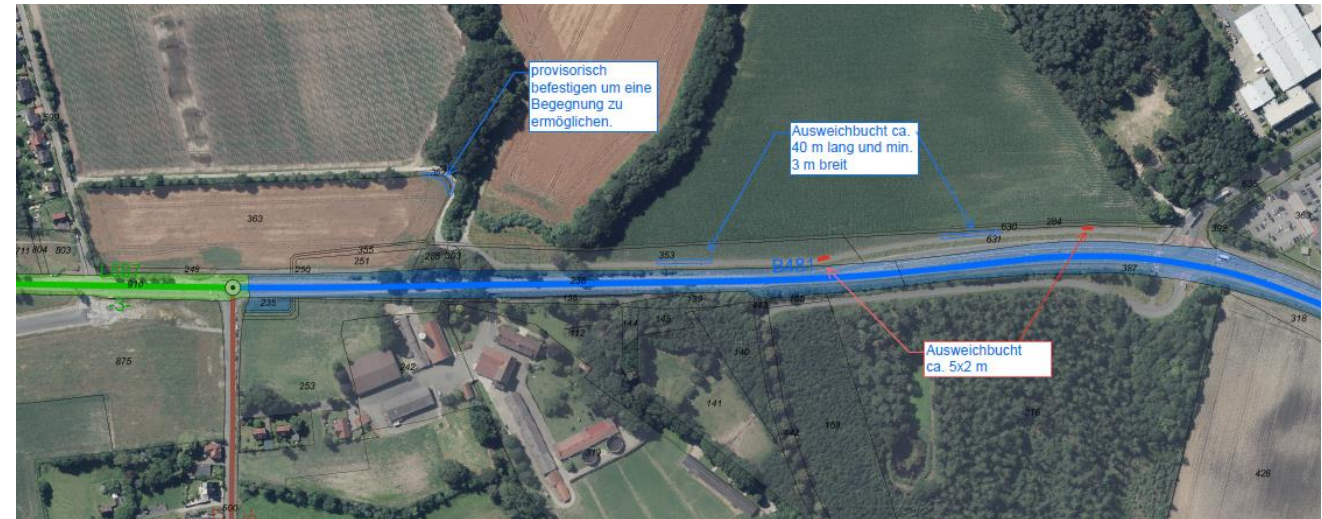

- 03.02.2026** Veröffentlichung Baumaßnahme
- 06.03.2026** Vergabe Bauvertrag
- 20.03.2026** Presseinfo B51 /B481- erster Hinweis auf Arbeiten am Schiff. Damm
- 23.03.2026** erste Info an Politik MS Ost
- 24.03.2026** Presseinfo Ankündigung Arbeiten Schiff. Damm mit Hinweis Einbahnstraße und Vollspernung
- 17.04.2026** Presseinfo Fertigstellung kleiner Knotenpunkt und Ankündigung Einbahnstraßenregelung
- 20.04.2026** Presseinfo, abgestimmt mit Stadt Münster u.a. mit konkreter Angabe Umleitung, sowie Erläuterung zum Vorgehen

B481 /Sudmühlenstraße: Abstimmung der komplexen Maßnahme

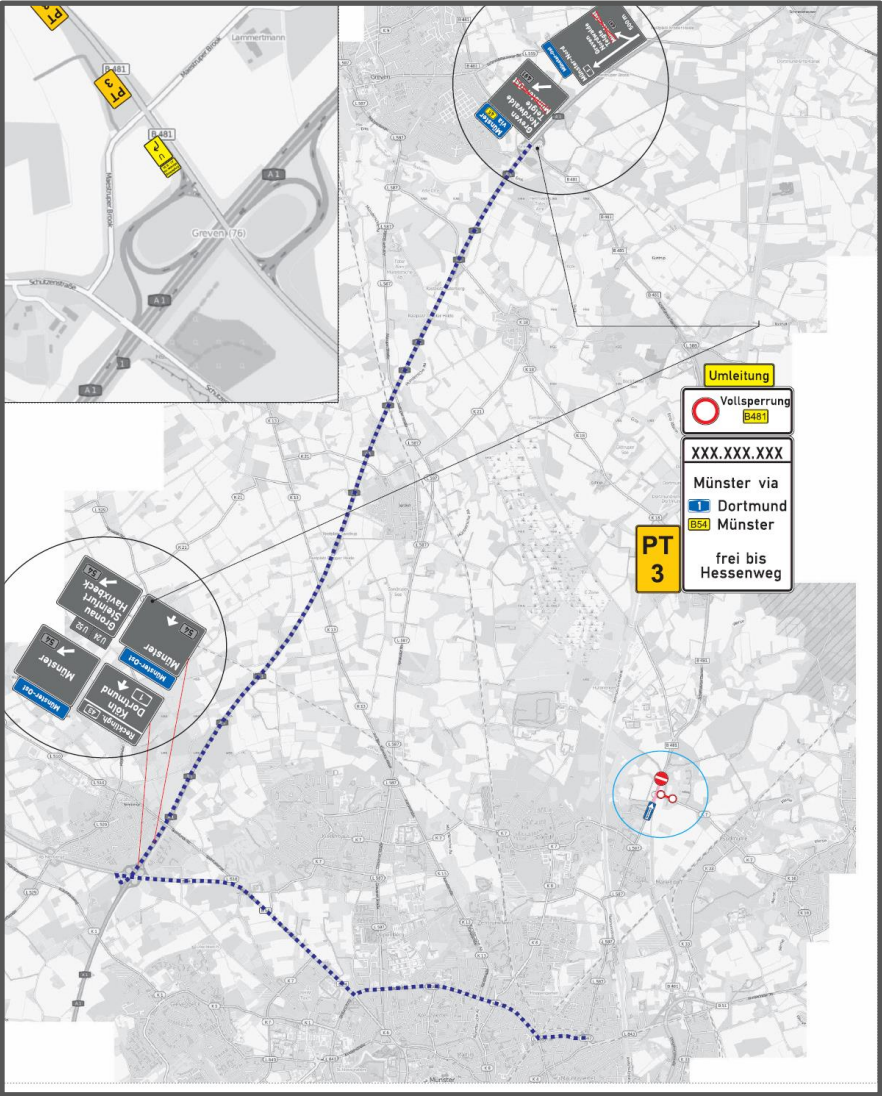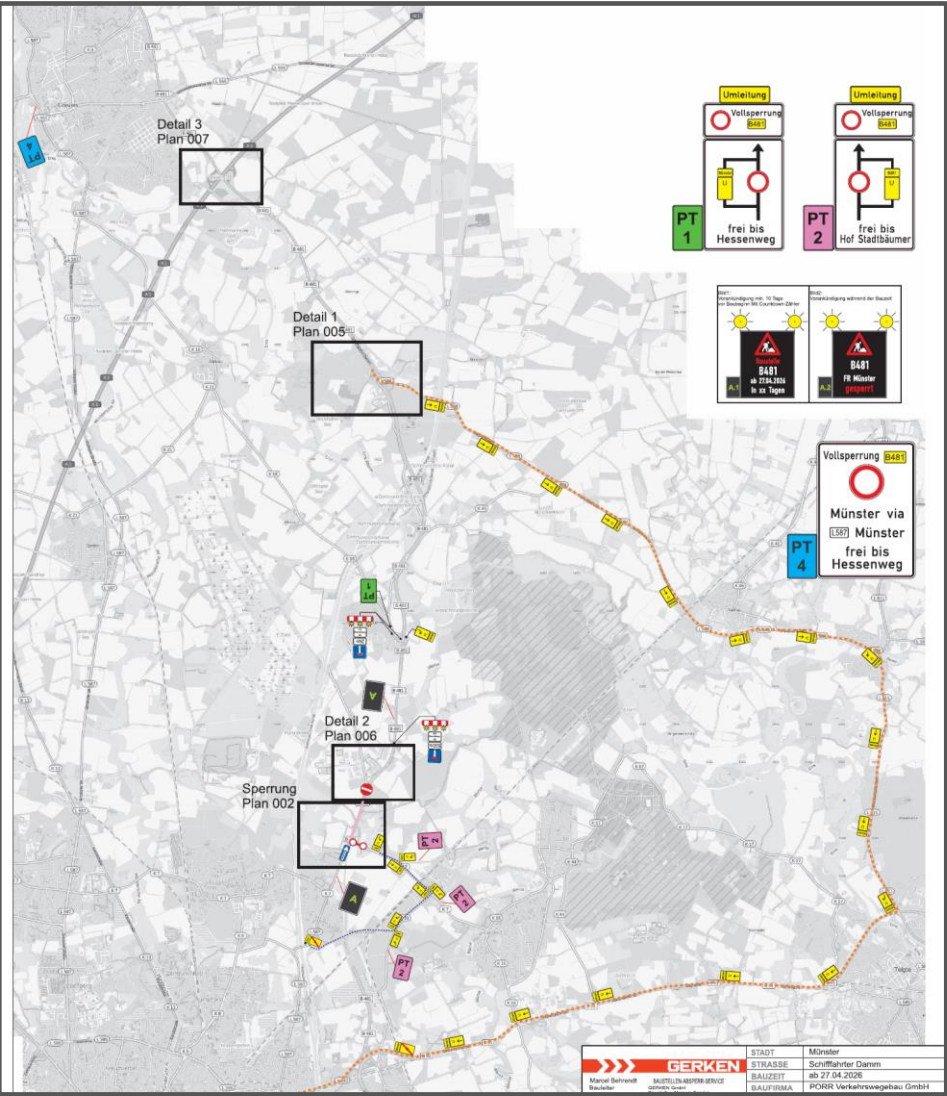

Verkehrsführung Baustelle Schiffahrter Damm

gebiet

Rieselfelder

Münster

Coerde

Einbahnstrasse

nur PKW

Einbahnstrasse

Coerdeheide

Westfalen AG

Industriegebiet

Hessenweg

Schiffahrter Damm

Sudmühlenstr.

Coerde

heide

Coerde

Guntrup

Brüskens

heide

Kreis Warendorf

Vadrup

West-Bevern

Gelmer

Fuostrup

Verth

Handorf

Telgte

Schwienhorst

Werse

Merendorf

Kemper

ST. MAURITZ

- Bauzeit: B481/Schiff. Damm Baubeginn 30.3.2026- Bauende September 2026
- Vollsperrung der B481 (Greven – Emsdetten), Sommer 2026 (Brücken und Straße)
- Nachfolgende Maßnahme abgestimmt– Stadtnetze Münster – Einbahnstraßenregelung Dyckburgstraße für 1,5 Jahre
- Bauarbeiten WSA Neubau Brücke Bahn, Warendorfer Straße ab Herbst 2026- Einschränkungen Warendorfer Straße

Baustellenkoordination für 2027/2028/...

- Maßnahmen Straßen.NRW wie u.a. Ausbau L793, Wolbecker Straße mit Vollsperrung 1 Jahr und teilweise kompletter Sperrung für Ersatzneubau Wersebrücke
- WSA Neubau der Brücke DEK Warendorfer Straße - nach Freigabe B51/B481 in 2028
- Umfangreiche Maßnahmen Albersloher Weg Stadt Münster

Freigabe Gesamtprojekt Umgehungsstraße Münster: Frühjahr 2028

